

1. 측정결과 - 2022. 07. 22.

| 측정 장비 (종류/수량) | 시료번호 | 측정 지점 | 유량 (ℓ/분) | 측정 일시 (분) | 측정 결과 (f/cc) | 검출석면의 종류 |
|----------------------|------|-----------|----------|--------------|-----------------|-------------|
| KMS-5100 / 10대 | #1 | 부지경계선1 | 9.96 | 245 | 0.0016 | 이하 |
| | #2 | 부지경계선2 | 9.95 | 245 | 0.0022 | 이하 |
| | #3 | 부지경계선3 | 9.92 | 245 | 0.0016 | 이하 |
| | #4 | 부지경계선4 | 9.92 | 245 | 0.0014 | 검출한계 이하 |
| | #5 | 작업장주변 | 9.93 | 125 | 0.0039 | 이하 |
| | #6 | 위생설비입구 | 9.97 | 45 | 0.0025 | 검출한계 이하 |
| | #7 | 음압기공기배출구1 | 9.96 | 45 | 0.0026 | 검출한계 이하 |
| | #8 | 음압기공기배출구2 | 9.93 | 45 | 0.0029 | 이하 |
| | #9 | 음압기공기배출구3 | 9.98 | 45 | 0.0033 | 이하 |
| | #10 | 폐기물반출구 | 9.92 | 45 | 0.0033 | 이하 |











- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 **0.01개/cc 이하**

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 10대

| 측정지점 | 비산측정 시작 사진 | 비산측정 종료 사진 | 결과(f/cc) |
|--------|---|--|----------|
| 부지경계선1 |  |  | 0.0016 |
| | 측정 시작 시간 08:27 | 측정 종료 시간 12:32 | |
| 부지경계선2 |  |  | 0.0022 |
| | 측정 시작 시간 08:27 | 측정 종료 시간 12:32 | |
| 부지경계선3 |  |  | 0.0016 |
| | 측정 시작 시간 08:30 | 측정 종료 시간 12:35 | |
| 부지경계선4 |  |  | 0.0014 |
| | 측정 시작 시간 08:31 | 측정 종료 시간 12:36 | |
| 작업장주변 |  |  | 0.0039 |
| | 측정 시작 시간 08:29 | 측정 종료 시간 10:34 | |

| 측정지점 | 비산측정 시작 사진 | 비산측정 종료 사진 | 결과(f/cc) |
|---------------|---|--|----------|
| 위생설비 입구 |  |  | 0.0025 |
| | 측정 시작 시간 08:35 | 측정 종료 시간 09:20 | |
| 음압기공기 배출구1 |  |  | 0.0026 |
| | 측정 시작 시간 08:37 | 측정 종료 시간 09:22 | |
| 음압기공기 배출구2 |  |  | 0.0029 |
| | 측정 시작 시간 08:37 | 측정 종료 시간 09:22 | |
| 음압기공기 배출구3 |  |  | 0.0033 |
| | 측정 시작 시간 08:40 | 측정 종료 시간 09:25 | |
| 폐기물 반출구 |  |  | 0.0033 |
| | 측정 시작 시간 09:59 | 측정 종료 시간 10:44 | |

1. 측정결과 - 2022. 07. 23.

| 측정 장비 (종류/수량) | 시료번호 | 측정 지점 | 유량 (ℓ/분) | 측정 일시 (분) | 측정 결과 (f/cc) | 검출석면의 종류 |
|--|------|-----------|----------|--------------|-----------------|-------------|
| KMS-5100 / 4대, LX40A / 4대 | #1 | 부지경계선1 | 9.91 | 245 | 0.0020 | 이하 |
| | #2 | 부지경계선2 | 9.92 | 245 | 0.0018 | 이하 |
| | #3 | 부지경계선3 | 9.97 | 245 | 0.0014 | 검출한계 이하 |
| | #4 | 부지경계선4 | 9.95 | 245 | 0.0016 | 이하 |
| | #5 | 작업장주변 | 9.93 | 125 | 0.0039 | 이하 |
| | #6 | 위생설비입구 | 9.90 | 45 | 0.0029 | 이하 |
| | #7 | 음압기공기배출구1 | 9.95 | 45 | 0.0029 | 이하 |
| | #8 | 음압기공기배출구2 | 9.94 | 45 | 0.0033 | 이하 |
| | #9 | 음압기공기배출구3 | 9.91 | 45 | 0.0029 | 이하 |
| | #10 | 폐기물반출구 | 9.94 | 45 | 0.0033 | 이하 |









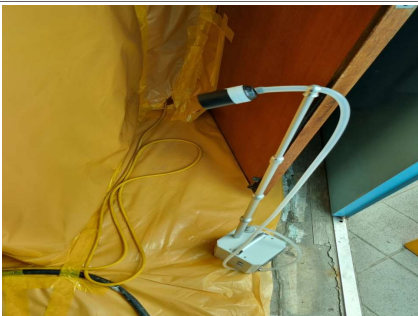
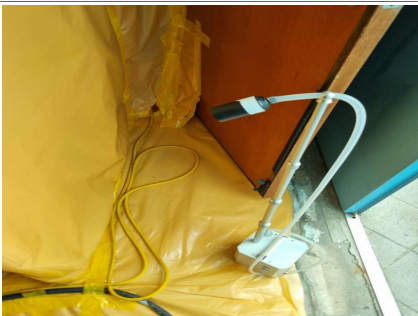
- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 **0.01개/cc 이하**

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 4대, LX40A / 4대

| 측정지점 | 비산측정 시작 사진 | 비산측정 종료 사진 | 결과(f/cc) |
|--------|---|--|----------|
| 부지경계선1 |  |  | 0.0020 |
| | 측정 시작 시간 07:30 | 측정 종료 시간 11:35 | |
| 부지경계선2 |  |  | 0.0018 |
| | 측정 시작 시간 07:33 | 측정 종료 시간 13:19 | |
| 부지경계선3 |  |  | 0.0014 |
| | 측정 시작 시간 07:35 | 측정 종료 시간 13:22 | |
| 부지경계선4 |  |  | 0.0016 |
| | 측정 시작 시간 07:36 | 측정 종료 시간 13:24 | |
| 작업장주변 |  |  | 0.0039 |
| | 측정 시작 시간 07:38 | 측정 종료 시간 10:18 | |

| 측정지점 | 비산측정 시작 사진 | 비산측정 종료 사진 | 결과(f/cc) |
|---------------|---|--|----------|
| 위생설비 입구 |  |  | 0.0029 |
| | 측정 시작 시간 07:43 | 측정 종료 시간 13:25 | |
| 음압기공기 배출구1 |  |  | 0.0029 |
| | 측정 시작 시간 07:46 | 측정 종료 시간 12:29 | |
| 음압기공기 배출구2 |  |  | 0.0033 |
| | 측정 시작 시간 07:47 | 측정 종료 시간 10:12 | |
| 음압기공기 배출구3 |  |  | 0.0029 |
| | 측정 시작 시간 08:34 | 측정 종료 시간 09:19 | |
| 폐기물 반출구 |  |  | 0.0033 |
| | 측정 시작 시간 08:40 | 측정 종료 시간 09:25 | |

1. 측정결과 - 2022. 07. 24.

| 측정 장비 (종류/수량) | 시료번호 | 측정 지점 | 유량 (ℓ/분) | 측정 일시 (분) | 측정 결과 (f/cc) | 검출석면의 종류 |
|--|------|-----------|----------|--------------|-----------------|-------------|
| KMS-5100 / 5대, LX40A / 4대 | #1 | 부지경계선1 | 9.94 | 245 | 0.0016 | 이하 |
| | #2 | 부지경계선2 | 9.92 | 245 | 0.0018 | 이하 |
| | #3 | 부지경계선3 | 9.93 | 245 | 0.0018 | 이하 |
| | #4 | 부지경계선4 | 9.96 | 245 | 0.0016 | 이하 |
| | #5 | 작업장주변 | 9.93 | 125 | 0.0043 | 이하 |
| | #6 | 위생설비입구 | 9.96 | 45 | 0.0026 | 검출한계 이하 |
| | #7 | 음압기공기배출구1 | 9.94 | 45 | 0.0029 | 이하 |
| | #8 | 음압기공기배출구2 | 9.93 | 45 | 0.0033 | 이하 |
| | #9 | 폐기물반출구 | 9.97 | 45 | 0.0029 | 이하 |

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 5대, LX40A / 4대

| 측정지점 | 비산측정 시작 사진 | 비산측정 종료 사진 | 결과(f/cc) |
|--------|---|--|----------|
| 부지경계선1 |  |  | 0.0016 |
| | 측정 시작 시간 06:00 | 측정 종료 시간 10:05 | |
| 부지경계선2 |  |  | 0.0018 |
| | 측정 시작 시간 06:01 | 측정 종료 시간 10:06 | |
| 부지경계선3 |  |  | 0.0018 |
| | 측정 시작 시간 06:03 | 측정 종료 시간 10:08 | |
| 부지경계선4 |  |  | 0.0016 |
| | 측정 시작 시간 06:05 | 측정 종료 시간 10:10 | |
| 작업장주변 |  |  | 0.0043 |
| | 측정 시작 시간 06:08 | 측정 종료 시간 08:13 | |

| 측정지점 | 비산측정 시작 사진 | 비산측정 종료 사진 | 결과(f/cc) |
|---------------|---|--|----------|
| 위생설비 입구 |  |  | 0.0026 |
| | 측정 시작 시간 06:10 | 측정 종료 시간 06:55 | |
| 음압기공기 배출구1 |  |  | 0.0029 |
| | 측정 시작 시간 06:16 | 측정 종료 시간 07:01 | |
| 음압기공기 배출구2 |  |  | 0.0033 |
| | 측정 시작 시간 06:17 | 측정 종료 시간 07:02 | |
| 폐기물 반출구 |  |  | 0.0029 |
| | 측정 시작 시간 07:03 | 측정 종료 시간 07:48 | |

1. 측정결과 - 2022. 07. 25.

| 측정 장비 (종류/수량) | 시료번호 | 측정 지점 | 유량 (ℓ/분) | 측정 일시 (분) | 측정 결과 (f/cc) | 검출석면의 종류 |
|----------------------|------|---------|----------|--------------|-----------------|-------------|
| SARA-5100 / 1대 | #1 | 폐기물보관지점 | 9.96 | 45 | 0.0033 | 이하 |

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 SARA-5100 / 1대

| 측정지점 | 비산측정 시작 사진 | 비산측정 종료 사진 | 결과(f/cc) |
|-------------|--|---|----------|
| 폐기물 보관지점 |  |  | 0.0033 |
| | 측정 시작 시간 09:06 | 측정 종료 시간 09:51 | |
