










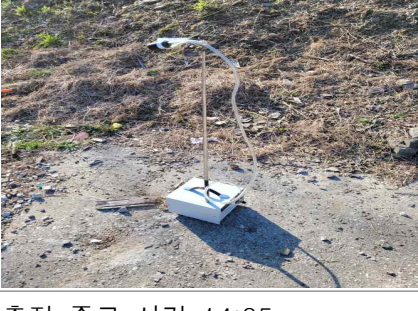
1. 측정결과 - 2022. 12. 08.(산북동 1047-2, 산북동 1531-1)

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX-40A / 11대	#1	부지경계1	9.91	245	0.0016	이하
	#2	부지경계2	9.95	245	0.0014	이하
	#3	부지경계3	9.92	245	0.0018	이하
	#4	부지경계4	9.97	245	0.0016	이하
	#5	부지경계5	9.93	245	0.0016	이하
	#6	부지경계6	9.93	245	0.0018	이하
	#7	부지경계7	9.92	245	0.0016	이하
	#8	부지경계8	9.95	245	0.0016	이하
	#9	위생설비입구1	9.90	45	0.0026	이하
	#10	위생설비입구2	9.93	45	0.0026	이하
	#11	작업장주변1	9.91	125	0.0028	이하
	#12	작업장주변2	9.94	125	0.0039	이하
	#13	폐기물반출구1	9.93	45	0.0033	이하
	#14	폐기물반출구2	9.94	45	0.0037	이하




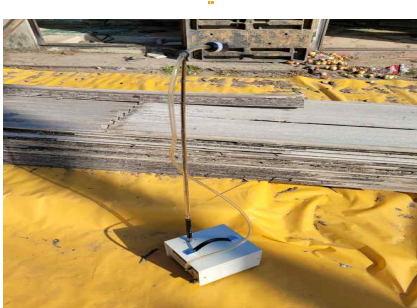
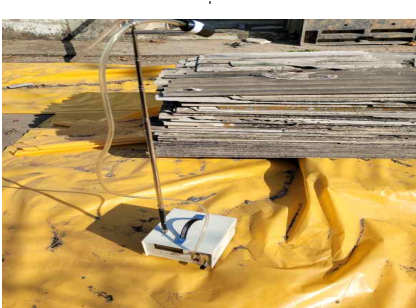


- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 LX-40A / 11대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계1			0.0016
	측정 시작 시간 08:30	측정 종료 시간 12:35	
부지경계2			0.0014
	측정 시작 시간 08:35	측정 종료 시간 12:40	
부지경계3			0.0018
	측정 시작 시간 08:38	측정 종료 시간 12:43	
부지경계4			0.0016
	측정 시작 시간 08:40	측정 종료 시간 12:45	
부지경계5			0.0016
	측정 시작 시간 10:30	측정 종료 시간 14:35	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계6			0.0018
	측정 시작 시간 10:32	측정 종료 시간 14:37	
부지경계7			0.0016
	측정 시작 시간 10:33	측정 종료 시간 14:38	
부지경계8			0.0026
	측정 시작 시간 10:34	측정 종료 시간 14:39	
위생설비1			0.0026
	측정 시작 시간 09:00	측정 종료 시간 09:45	
위생설비2			0.0028
	측정 시작 시간 11:00	측정 종료 시간 11:45	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
<p data-bbox="172 371 316 398">작업장주변1</p>	 <p data-bbox="352 524 627 551">측정 시작 시간 09:30</p>	 <p data-bbox="798 524 1072 551">측정 종료 시간 11:35</p>	<p data-bbox="1289 371 1382 398">0.0039</p>
<p data-bbox="172 741 316 768">작업장주변2</p>	 <p data-bbox="352 902 627 929">측정 시작 시간 11:10</p>	 <p data-bbox="798 902 1072 929">측정 종료 시간 13:15</p>	<p data-bbox="1289 741 1382 768">0.0039</p>
<p data-bbox="197 1111 274 1160">폐기물 반출구1</p>	 <p data-bbox="352 1279 627 1305">측정 시작 시간 10:20</p>	 <p data-bbox="798 1279 1072 1305">측정 종료 시간 11:05</p>	<p data-bbox="1289 1111 1382 1137">0.0033</p>
<p data-bbox="197 1480 274 1529">폐기물 반출구2</p>	 <p data-bbox="352 1646 627 1673">측정 시작 시간 13:05</p>	 <p data-bbox="798 1646 1072 1673">측정 종료 시간 13:50</p>	<p data-bbox="1289 1480 1382 1507">0.0037</p>

1. 측정결과 - 2022. 12. 09.(산북동 1529-3)



측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
SARA-5100 / 7대	#1	부지경계1	9.89	245	0.0022	이하
	#2	부지경계2	9.88	245	0.0022	이하
	#3	부지경계3	9.89	245	0.0022	이하
	#4	부지경계4	9.92	245	0.0020	이하
	#5	위생설비	9.91	45	0.0037	이하
	#6	작업장주변	9.93	125	0.0036	이하
	#7	폐기물반출구	9.90	45	0.0037	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 SARA-5100 / 7대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계1			0.0018
	측정 시작 시간 10:30	측정 종료 시간 14:25	
부지경계2			0.0018
	측정 시작 시간 10:32	측정 종료 시간 14:37	
부지경계3			0.0018
	측정 시작 시간 10:33	측정 종료 시간 14:38	
부지경계4			0.0020
	측정 시작 시간 10:36	측정 종료 시간 14:41	
위생설비			0.0037
	측정 시작 시간 10:40	측정 종료 시간 11:25	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
<p data-bbox="172 371 311 405">작업장주변</p>	 <p data-bbox="347 526 624 560">측정 시작 시간 10:45</p>	 <p data-bbox="790 526 1066 560">측정 종료 시간 12:50</p>	<p data-bbox="1284 371 1380 405">0.0036</p>
<p data-bbox="199 719 284 775">폐기물 반출구</p>	 <p data-bbox="347 889 624 922">측정 시작 시간 14:55</p>	 <p data-bbox="790 889 1066 922">측정 종료 시간 15:40</p>	<p data-bbox="1284 730 1380 763">0.0037</p>

1. 측정결과 - 2022. 12. 10.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX-40A / 2대	#1	폐기물보관지점1	9.93	45	0.0037	이하
	#2	폐기물보관지점2	9.89	45	0.0040	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 LX-40A / 2대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물 보관지점1			0.0037
	측정 시작 시간 09:35 측정 종료 시간 10:20		
폐기물 보관지점2			0.0040
	측정 시작 시간 09:44 측정 종료 시간 10:29		
